




НИЙСЛЭЛИЙН 2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ



2025 ОН



УЛС, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ болон ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН 2025 оны хөрөнгө оруулалт

2025 онд нийт **5.9** их наяд санхүүжилт хийгдэнэ






НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

улс, нийслэлийн төсөв болон гадаадын зээл, тусламж, 2025 оны санхүүжих дүн





ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

ЗАРЛАЛТЫН ХУВЬ;

97.4%


483 төсөл, арга хэмжээ




ҮР ДҮН ГАРСАН;

72.5%


364 төсөл, арга хэмжээ

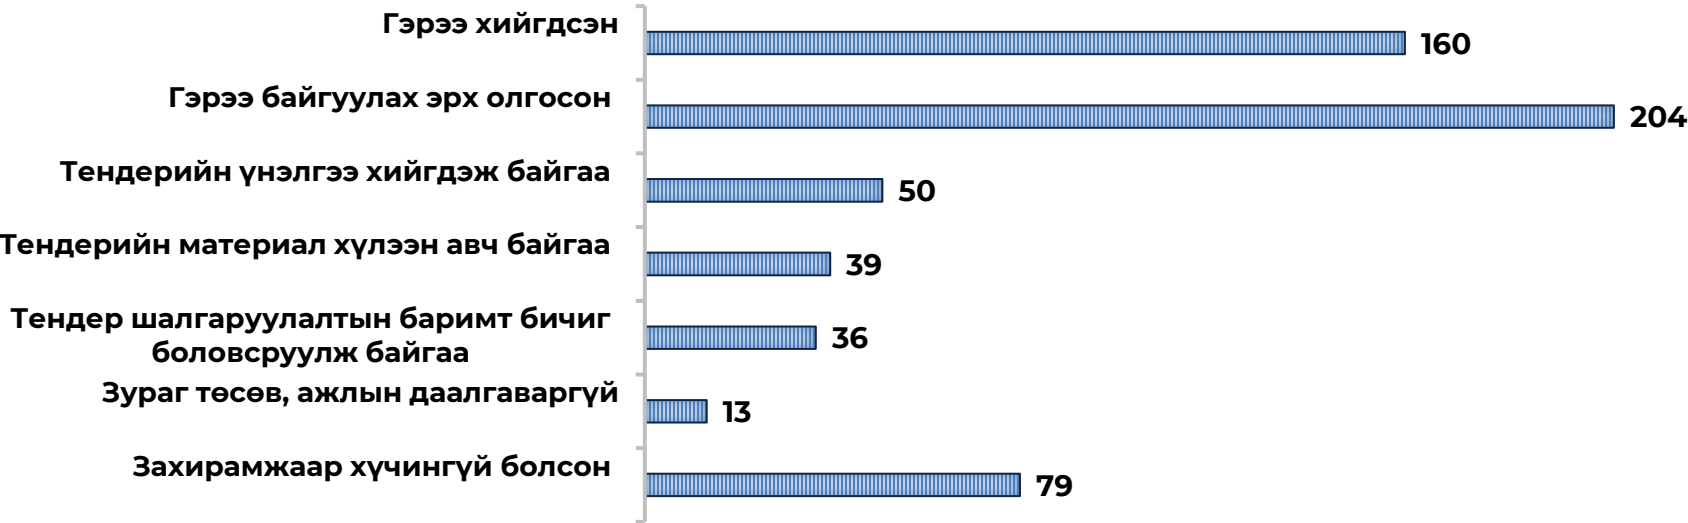



АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ:

83 НИЙТ ТӨСӨЛ
ЯВЦ: 49%

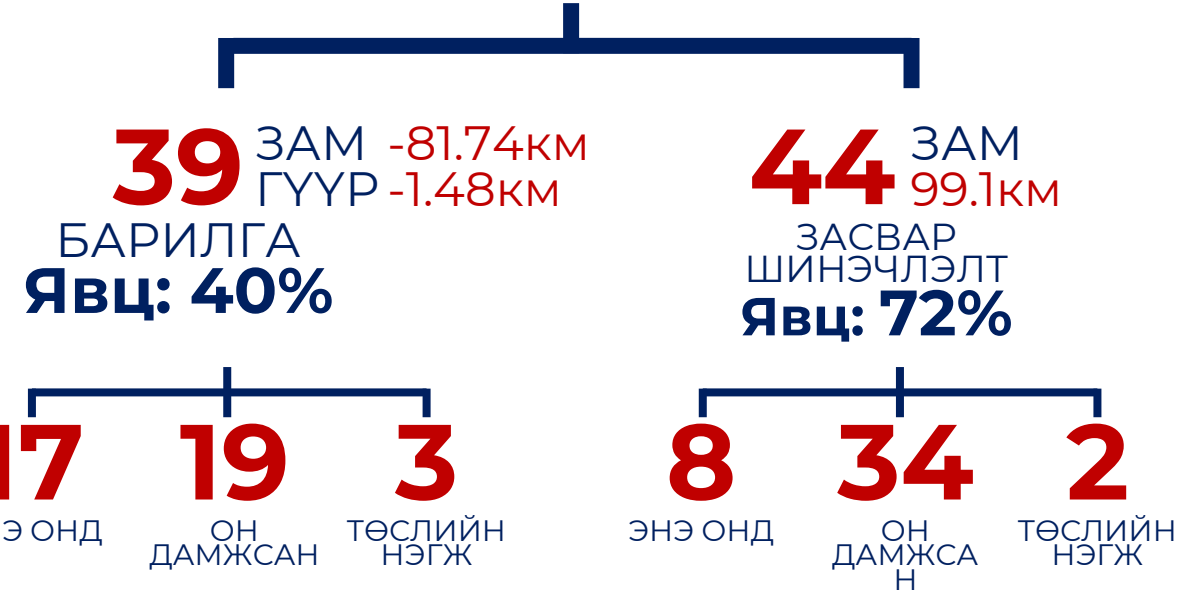



АРЧЛАЛТЫН
АЖИЛ

Явц: 60%


БОРООНЫ УС
ЗАЙЛУУЛАХ
БАЙГУУЛАМЖ

12 УРТ
17.09км





ШИНЭЭР ХИЙГДЭЖ БУЙ АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ

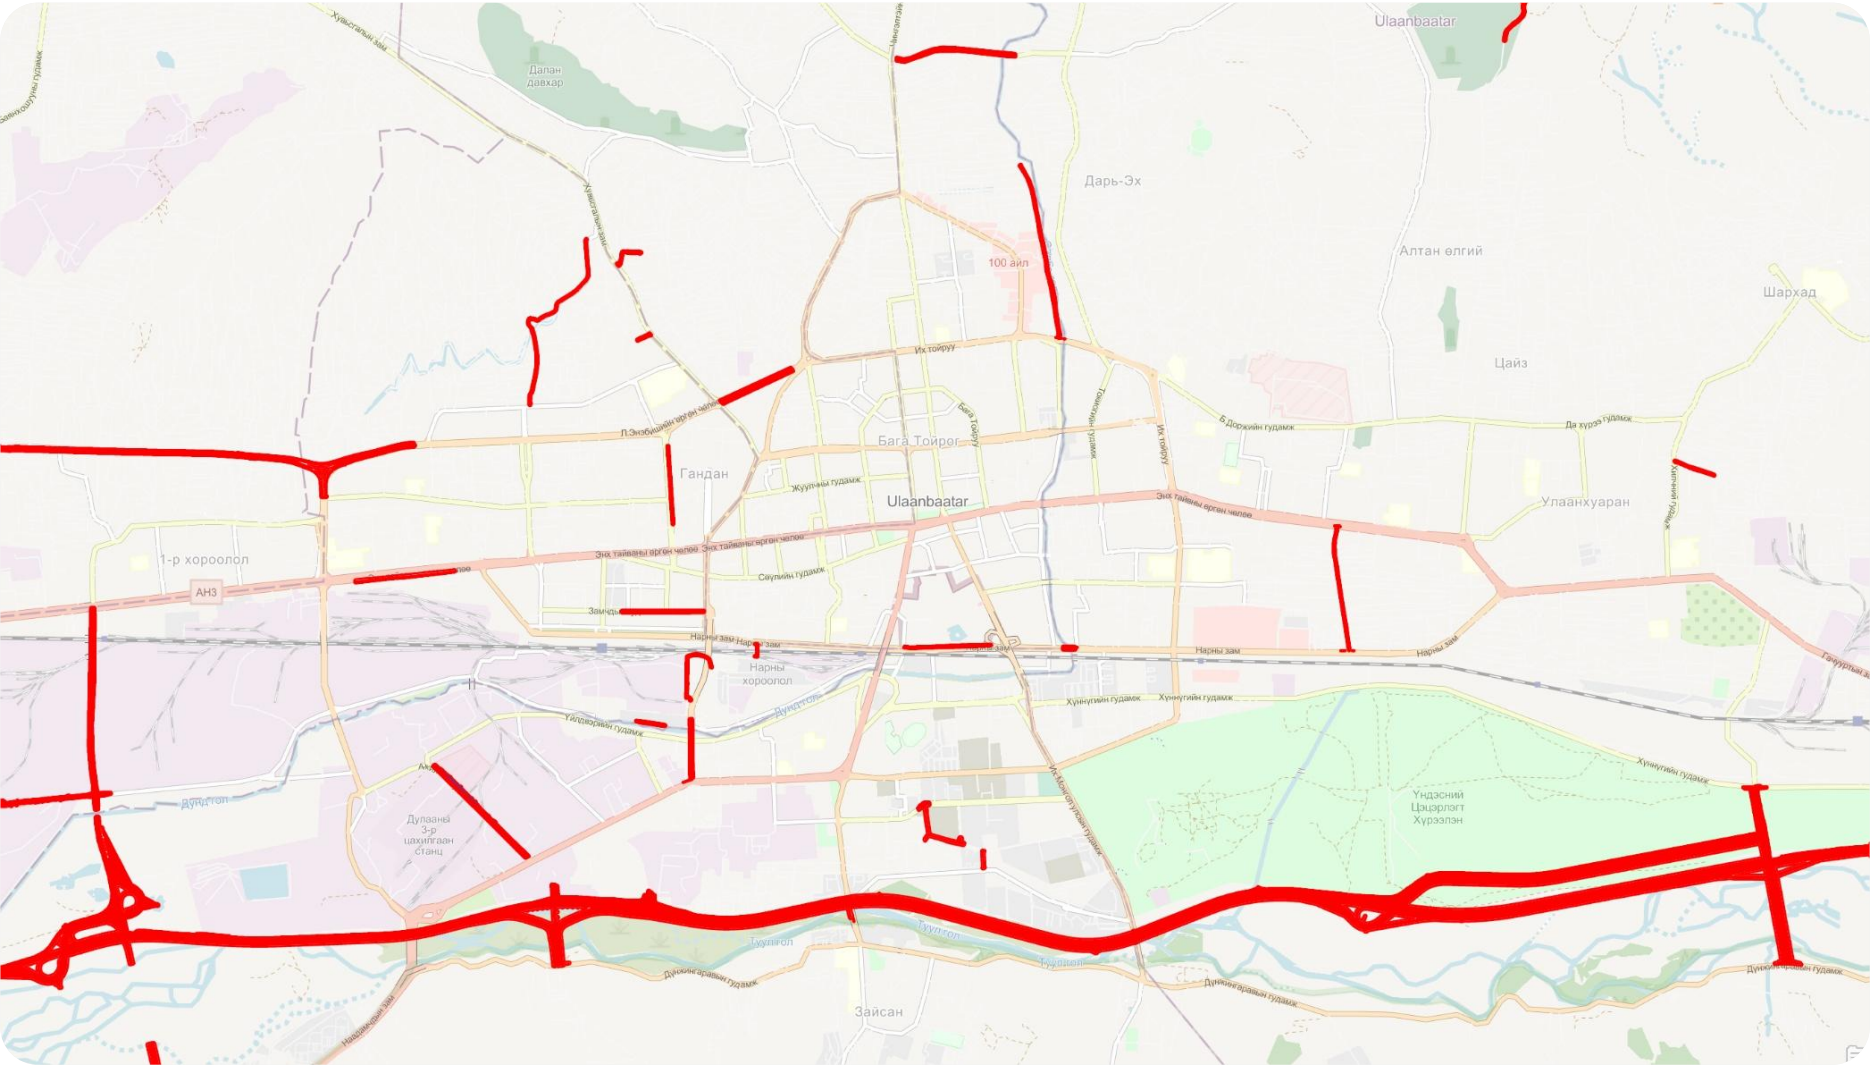

ҮЕ ШАТ

5
ХУДАЛДАН
АВАХ

25
БАРИЛГЫН
АЖИЛ


6
ДУУССАН
АЖИЛ

3
ТӨСӨЛ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
НЭГЖ

НИЙТ: 39

ХЭРЭГЖИЛТЫН ХУВЬ
40%

ЗАМ - 81.74км
ГҮҮР - 1.48км



ЗАЙСАНГИЙН ГҮҮР




ТОЛГОЙТ – АРД АЮУШ



ЯПОН ЦЭРГИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗАР



АР ГҮНТ



ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙГДЭХ АВТО ЗАМЫН АЖИЛ



ҮЕ ШАТ

0
ХУДАЛДАН
АВАХ

17
БАРИЛГЫН
АЖИЛ




27
ДУУССАН
АЖИЛ


2
ТӨСӨЛ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
НЭГЖ

НИЙТ: 44

ХЭРЭГЖИЛТЫН ХУВЬ
72%

ЗАМ - 99.1км

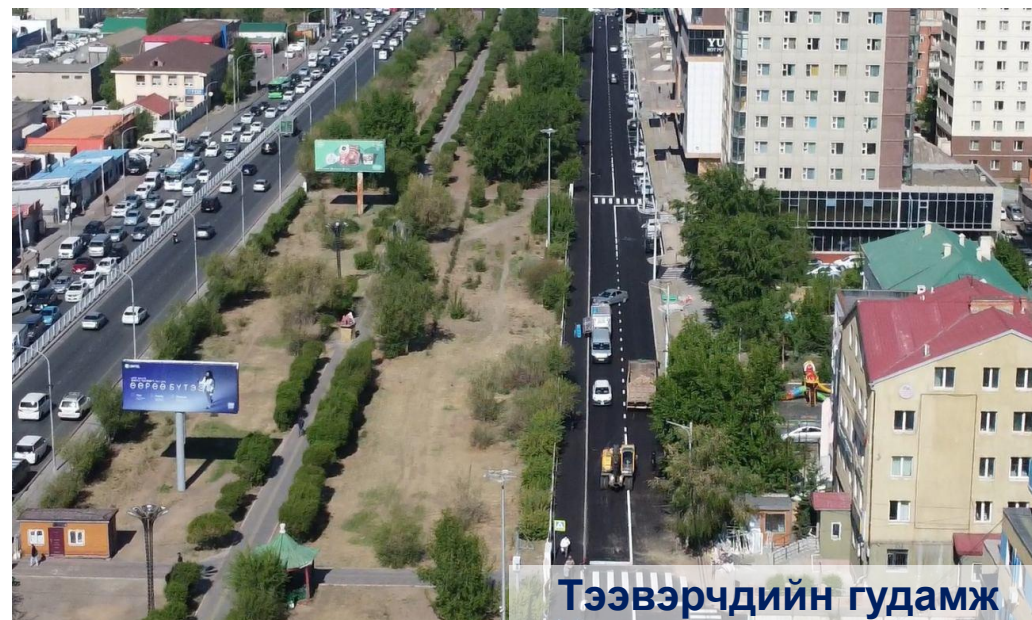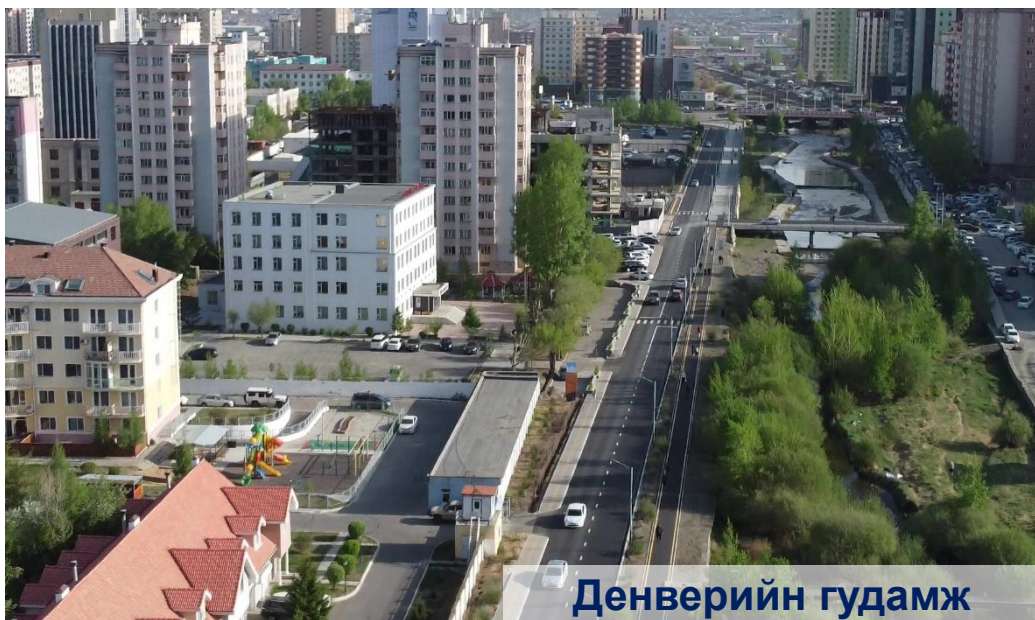



Найрамдалын зам



Хайлаастын гудамж




Чингисийн өргөн чөлөө



Хонхны гудамж




Шар хадны гудамж



Тэц III – Говь ХХК



Төв шуудан

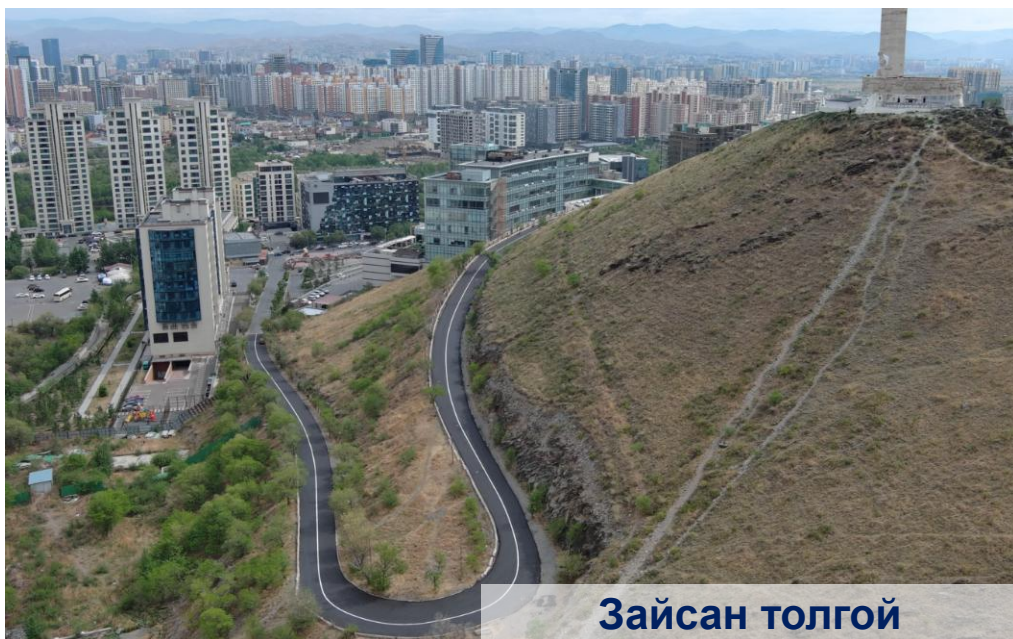


Зайсан толгой




F/2.8, SS 32.17, ISO 100, EV 0, DZOOM 1.000, GPS (106.8790, 47.9144, 20), D 23.17m, H 3.40m, H.S 1.96m/s, V.S -0.00m/s

Энхтайваны өргөн чөлөө





ШИНЭЭР БОЛОН
ӨРГӨТГӨЛ ХИЙГДЭХ УС
ЗАЙЛУУЛАХ
БАЙГУУЛАМЖ ТӨСӨЛ
АРГА ХЭМЖЭЭ

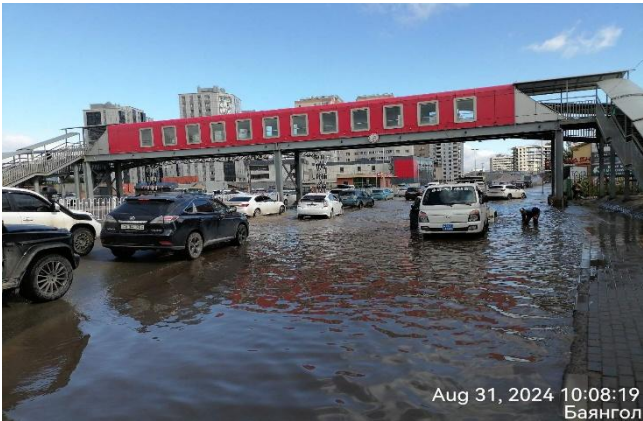

2025 онд 12 байршилд 17 км авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил хийж гүйцэтгэнэ.

Гүйцэтгэгч Геодези, усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ

№	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хэм/нэгж	Хүчин чадал /м/
1	БГД, 4-р хороо, Төмөр замын авто зогсоол орчмын борооны ус зайлуулах шугамын ажил	м	2,393
2	ХУД, 15-р хороо, “Энхтайваны гүүр”-ний доод хэсгийн зам талбайн ус зайлуулах шугамын ажил	м	1,200
3	БГД, 5-р хороо, Алтай хотхоны 14-р байр орчмын борооны ус зайлуулах шугамын ажил	м	1,260
4	БГД, 24, 26-р хороо Энгельсийн гудамжны авто замын борооны ус зайлуулах шугамын шинэчлэл, өргөтгөлийн ажил	м	1003
5	ХУД, 3-р хороо, ТЭЦ-3-ын арын уулзвараас Дунд голын гүүр хүртэлх борооны ус зайлуулах шугамын ажил	м	1398
6	ЧД, 2-р хороо, Хувьсгалын гудамжны борооны ус зайлуулах шугамын ажлын зураг төсөл, Их тойруу /Бөмбөгөр худалдааны төвөөс Баруун 4 зам хүртэл/-ийн борооны ус зайлуулах шугамын ажил	м	1369
7	ХУД,3, 5-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний борооны ус зайлуулах шугамын ажил	м	6541
8	БЗД, 14-р хороо, Нарт хотхон орчмын борооны ус зайлуулах шугамын ажил	м	716
9	ХУД 1 дүгээр хороо Наран хотхон, Петровисын ШТС орчмын авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил	м	268
10	СХД, 29-р хороо, "Драгоны арын 226 байр орчмын замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил	м	320
11	Замын ус зайлуулах шугам засвар, өргөтгөлийн ажил	м	600
12	Замын ус зайлуулах худгийн засвар, өргөтгөлийн ажил	ш	650
	Нийт шинээр барих шугамын урт		17,068

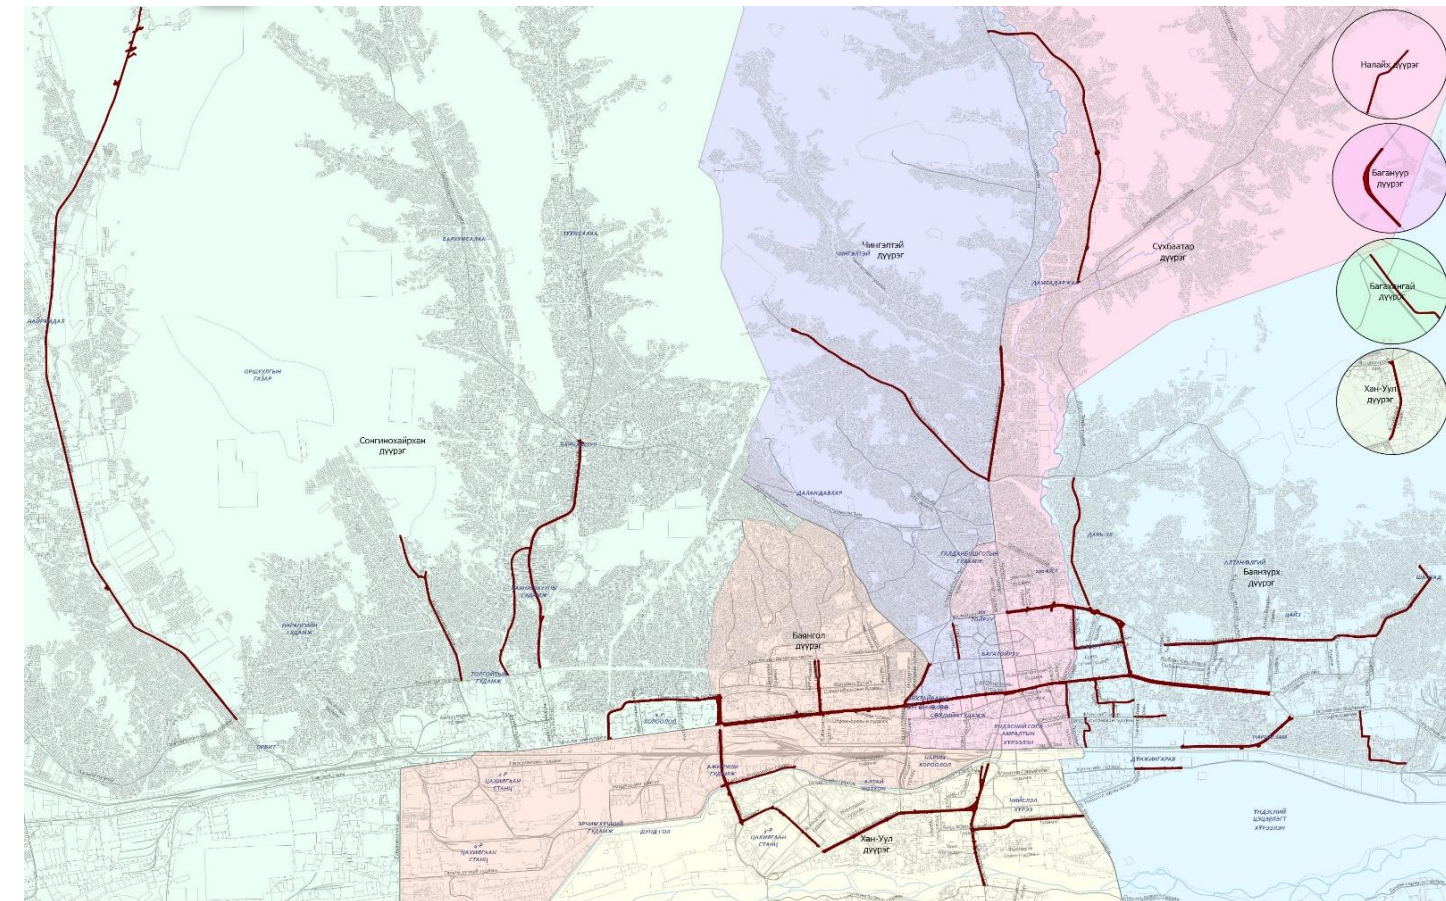

АВТО ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН БЭЛТГЭЛ

2025 оны 4 дүгээр сарын 8-аас 12 дугаар сарын 30-ыг хүртэл өвлийн улиралд нүхэн эвдрэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор арчлалтын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу тогтмол хийж гүйцэтгэж байна. Иймд арчлалтын ажлын үр дүнд өвлийн улиралд нүхэн эвдрэл үүсэх эрсдэл маш бага буюу бараг үүсэхгүй байх нөхцөл бүрдэнэ.

НИЙТ : 60%

Сэлхийн авто зам




Бэлхийн авто зам



Дэнжийн 1000-н авто зам




УРТ - 1231 км




ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ




ЧИНГИСИЙН ӨРГӨН ЧӨЛӨӨНИЙ НЭМЭЛТ
ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

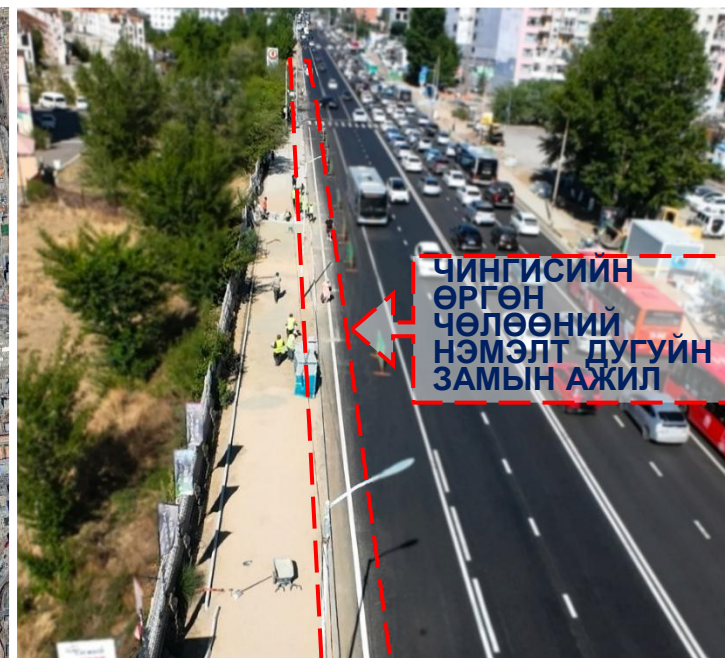

АВТО ЗАМЫН ЗОРЧИХ ХЭСЭГТ ДУГУЙН ЗАМЫН НЭМЭЛТ ЭГНЭЭНИЙ СУДАЛГАА



ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

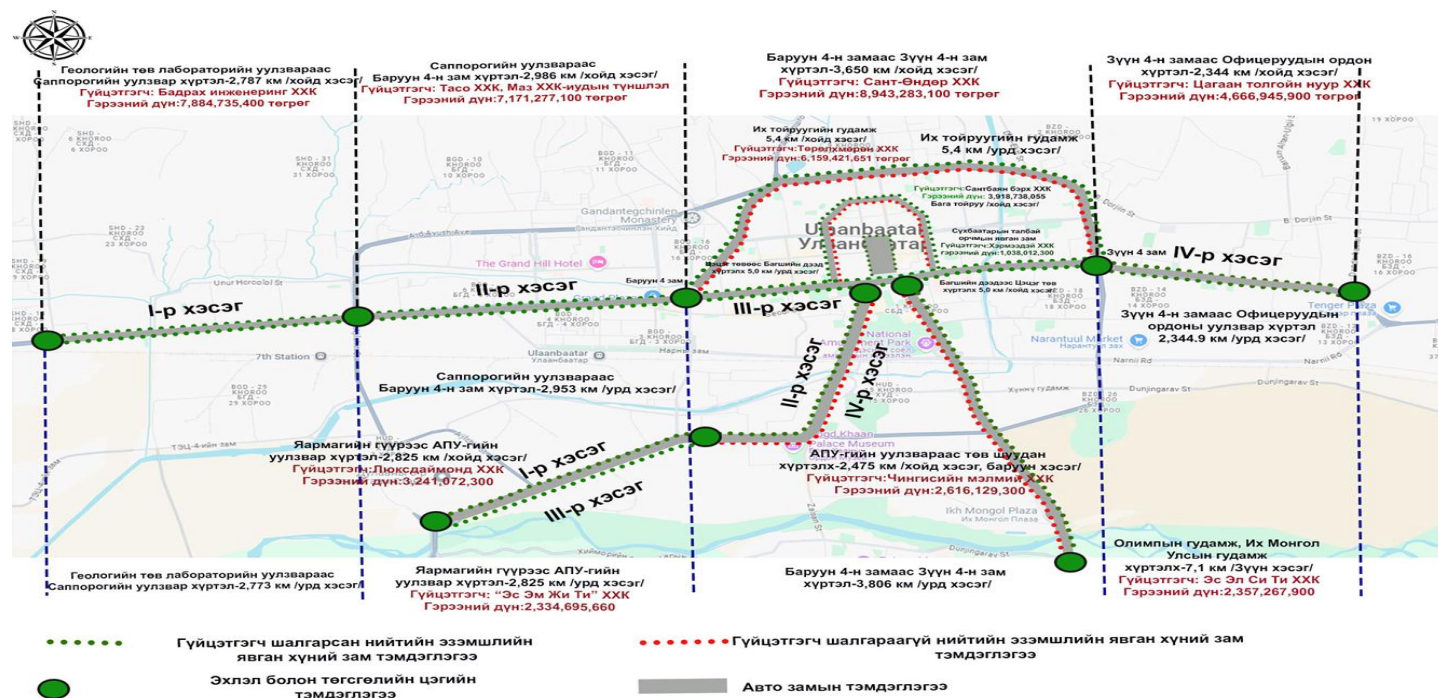

2025 оны байдлаар нийслэлийн хэмжээнд байгалын чулуун хавтангаар 59.6км явган замыг шинэчилж байна.


- Бага тойруугийн гудамж
- Чингисийн өргөн чөлөө
- Их тойруу
- Их Монголын гуламж зам



МАРШАЛЫН ГҮҮРНЭЭС ЦЕНТРАЛ ТАУРЫН УУЛЗВАР ХҮРТЭЛХ ЯВГАН ЗАМ



2025 ОНД ХЭРЭГЖИХ ЯВГАН ЗАМ



ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН НЭГТГЭЛ МЭДЭЭ


Ажлын төрөл		Ажлын тоо	Нөлөөлөлд өртсөн	Чөлөөлсөн нэгж талбарын тоо			Чөлөөлөөгүй			
			нэгж талбарын тоо	Нөхөх олговор олгосон	Дүйцүүлж газар олгосон	Нөлөөллөөс гаргасан	НЗД-ын захирамжийн төсөлд хянагдаж байгаа	Үлдсэн нэгж талбарын тоо	Үүнээс татгалзсан нэгж талбарын тоо	Шаардлагатай хөрөнгө /тэрбум төг/
Гэр хорооллыг орон сууцжуулах ажил	Сэлбэ дэд төв	1	2206	1790	2	212	0	202	43	82.00
	Ханын материал	1	232	180	0	25	4	27	10	10.00
	Дэнжийн мянга дэд төв	1	58	51	0	0	0	7	5	5.20
	Баянбүрд орчмын ХЕТ	3	97	34	0	0	0	63	5	25.00
	УБ арина	1	30	9	0	0	0	21	0	10.5
НИЙТ		7	2623	2064	2	237	4	320	63	132.7
Авто зам, замын байгууламжийн ажил	Мега төслүүд	1	105		15		0	90	0	60.00
	Нүхэн гарц	3	40	10			0	30	3	14.10
	Авто зам	19	830	406			21	424	27	62.06
	Авто зогсоол	1	44	0			6	44	0	25.00
Инженерийн шугам сүлжээ		6	159	18			0	141	0	145.10
НИЙТ		30	1178	434			27	729	30	306.26
Нийгмийн дэд бүтэц	Сургууль	6	92	51			7	41	5	5.10
	Цэцэрлэг	5	35	23			2	12		3.00
	Сургууль, цэцэрлэгийн зогсоол	30	50	34			0	16	0	14.70
	Гал түймэр унтраах анги	3	67	33			10	34		15.30
	Хог шатаах үйлдвэр	1	158					158		7.20
	Бусад	12	335	195			19	140		
НИЙТ		57	737	336	0	0	38	401	5	45.3
НЭГТГЭЛ		94	4,538	2,834	2	237	69	1,450	98	484.26

Нийслэлийн Засаг даргын 72 удаагийн захирамжаар:

- 2834 нэгж талбарт,
- 16.44 га талбайг,
- 98.89 тэрбум төгрөгөөр чөлөөлсөн.

Нийслэлийн Засаг даргын 18 захирамжийн төсөлд:

- 68 нэгж талбарт,
- 2.67 га талбайг,
- 14.89 тэрбум төгрөгөөр чөлөөлөхөөр ажиллаж байна.



ЧИНГЭЛТЭЙ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ - СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ



Нөлөөлөлд **2206** нэгж талбарын **158,0** га газар өртсөн:


Мэдээлэл:

Үүнээс:	Чөлөөлсөн	1792
	Зөвшилцөх шатандаа	81
	Үнэлгээ зөвшөөрөөгүй	34
	АТД хүссэн, Худалдаа үйлчилгээний төв	105
	Маргаантай	11
	Бичиг баримтын зөрчилтэй	6
	Эзэмших эрхтэй	27
	Төрийн байгууллага, Чөлөөлөхгүй нэгж талбар	107
Татгалзсан		43
НИЙТ		2206


2025 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар:

- 2024-2025 оны өссөн дүнгээр нийт 44 удаагийн захирамжаар 1772 иргэнд **355.2** тэрбум төгрөг олгохоос 1756 иргэнд **349.6** тэрбум төгрөг олгосон байна.
- Захирамжийн 2 удаагийн төсөлд 18 нэгж талбарт **5.2** тэрбум төгрөгөөр зөвшилцөн НЗДТГ-т хянагдаж байгаа бөгөөд өссөн дүнгээр нийт 1792 нэгж талбартай гэрээ байгуулаад байна.
- Чөлөөлөх-**203** нэгж талбар-**82** тэрбум





СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 5-Р ХОРОО - ХАНЫН МАТЕРИАЛ ОРЧМЫГ ОРОН СУУЦЖУУЛАХ АЖЛЫН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

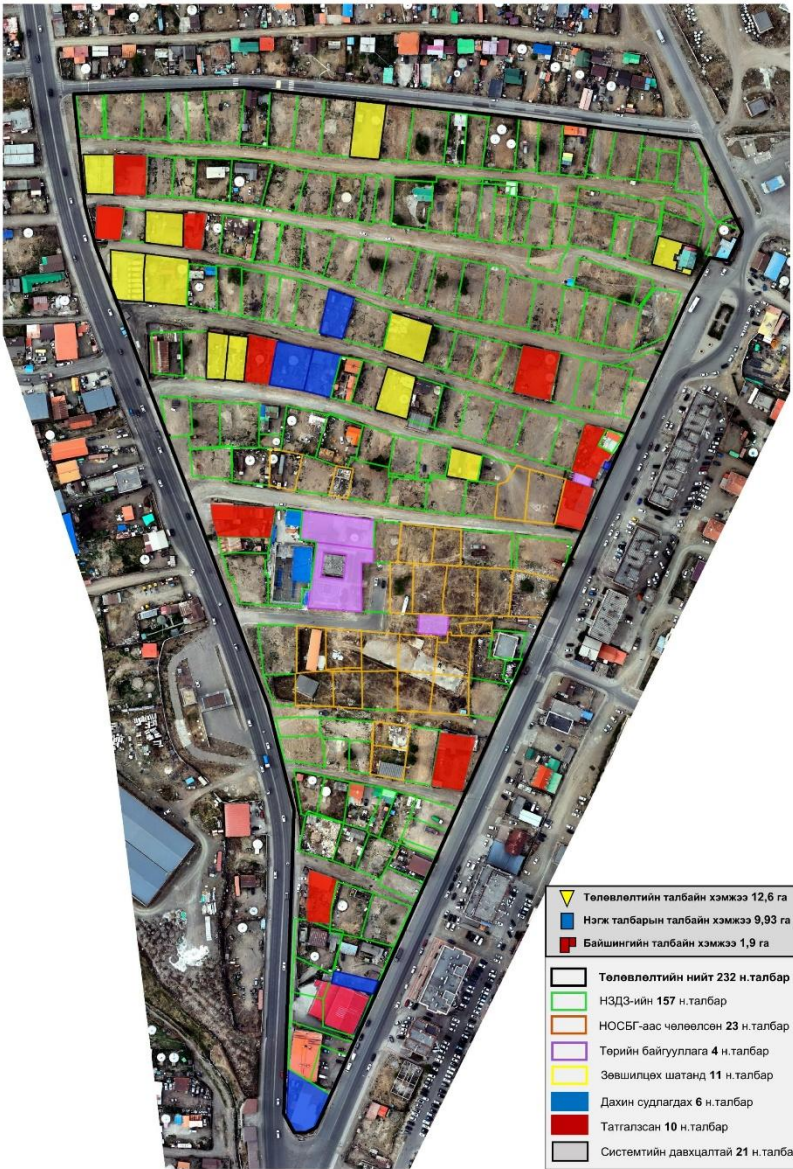


Нөлөөлөлд **232** нэгж талбарын
12.6 га газар өртсөн:

Үүнээс:	Чөлөөлсөн	157
	НОСБГ-аас чөлөөлсөн	23
	Төрийн байгууллага	4
	Системийн давхцалтай	21
	Зөвшилцөх шатандаа	11
	Дахин судлагдах	6
	Татгалзсан	10
НИЙТ		232


Мэдээлэл:

- Төсөлд хянагдаж байгаа 20 нэгж талбарт шаардагдах хөрөнгө **6,9** тэрбум
- Зөвшилцөх шатандаа байгаа 27 нэгж талбарт хөрөнгийн үнэлгээ хийхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. **10** тэрбум





ДЭНЖИЙН МЯНГА ДЭД ТӨВИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ

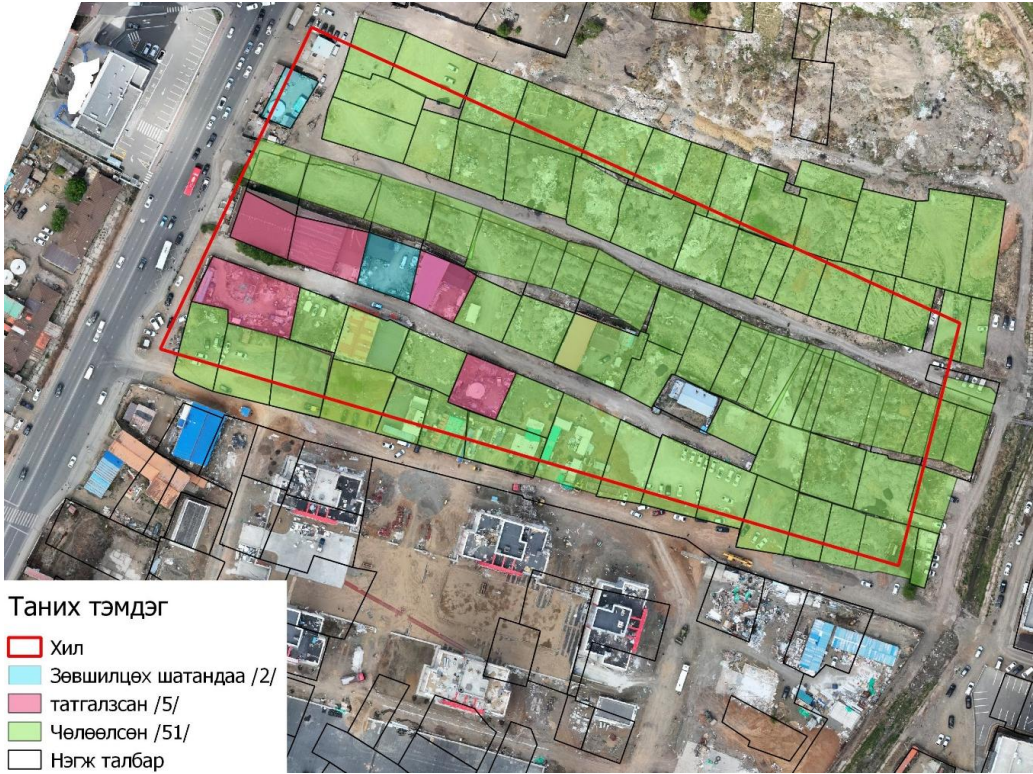

Таних тэмдэг

- Хил
- Зөвшилцөх шатандаа /2/
- татгалзсан /5/
- Чөлөөлсөн /51/
- Нэгж талбар

Нөлөөлөлд **58** нэгж талбарын **28500** м.кв газар өртсөн:

Үүнээс:	Үнэлгээ хийгдсэн -	
	Чөлөөлсөн	51
	Зөвшилцөх	2
	Татгалзсан	5
Нийт		58

Мэдээлэл:.

- 7 нэгж талбарын газар чөлөөлөх зардалд нийт **5,2 тэрбум** төгрөг шаардлагатай.
- Нийслэлийн Засаг даргын 10 удаагийн захирамжаар 51 нэгж талбарт **13.7 тэрбум** төгрөгийн нөхөх олговор олгож чөлөөлсөн.

ШИНЭ ИХ ТОЙРУУ, БАЯНБҮРД ОРЧМЫН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ



Таних тэмдэг


- Хил
- Нэгж талбар
- ДЗД захирамжаар хүчингүй болгох болон газрыг газраар дүйцүүлэх /21/
- Зөвшилцөх шатандаа /2/
- Зөвшилцсөн /9/
- Гурван бухат ХХК-тай гэрээ дүгнэсэн /19/
- Гурван бухат ХХК-тай зөвшилцөөгүй /4/
- Чөлөөлөх шаардлагатай /35/

Нөлөөлөлд **86** нэгж талбарын **45527** м.кв газар өртсөн:

Үүнээс:	Чөлөөлсөн	9
	Гурван бухат ХХК-тай зөвшилцсөн	19
	Гурван бухат ХХК-тай зөвшилцөөгүй	4
	Зөвшилцөх шатандаа	2
	ДЗД-ын захирамжаар хүчингүй болгох болон газрыг газраар дүйцүүлэн шилжүүлэх	21
	Чөлөөлөх шаардлагатай	31
НИЙТ		86

Мэдээлэл:

- Дүүргийн ЗД-ийн газар эзэмших эрхийг гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай захирамжийн төсөлд 13 нэгж талбар хянагдаж байгаа.
- НЗД-ийн захирамжаар байршил шилжүүлэх 8 нэгж талбар
- Нийт нөлөөлөлд өртсөн 35 нэгж талбарт сонсох ажиллагааны мэдэгдэл хүргүүлсэн.
- Гурван бухат ХХК-ийн зөвшилцсөн нэгж талбаруудын зөрүү төлбөрийн асуудлыг хянуулж байна.



БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР:

Нийслэлийн Боловсролын салбарт 848.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй барилга, байгууламжийн 139 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна.

№	Байгууллагын нэр	Улсын төсөв	Нийслэлийн төсөв	Дүүргийн төсөв	АХБ-ны зээлийн төсөл	Бусад төслүүд	Дүн
1	Сургууль	21	17	1	3	1	43
2	Цэцэрлэг	36	13	12	4	2	67
3	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор	11	10	1	-	-	22
4	Спорт заал	3	4	-	-	-	7
	Дүн	71	44	14	7	3	139



Сургуулийн барилга **4**
БСЦЦ-ийн барилга **3**



2960 хүүхэд
840 хүүхэд



Цэцэрлэгийн барилга **5**




650 хүүхэд


2025 оны урьдчилсан төлөвлөгөөгөөр ашиглалтад орох боловсролын байгууллага:

- **24** сургууль /**14000** суудал/,
- **45** цэцэрлэг /**7500** ор/,
- **14** бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын /**3640** хүүхэд/.


4 сургууль, 5 цэцэрлэг, 3 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга ашиглалтад хүлээн авсан.




БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР:



НИЙТ: 139

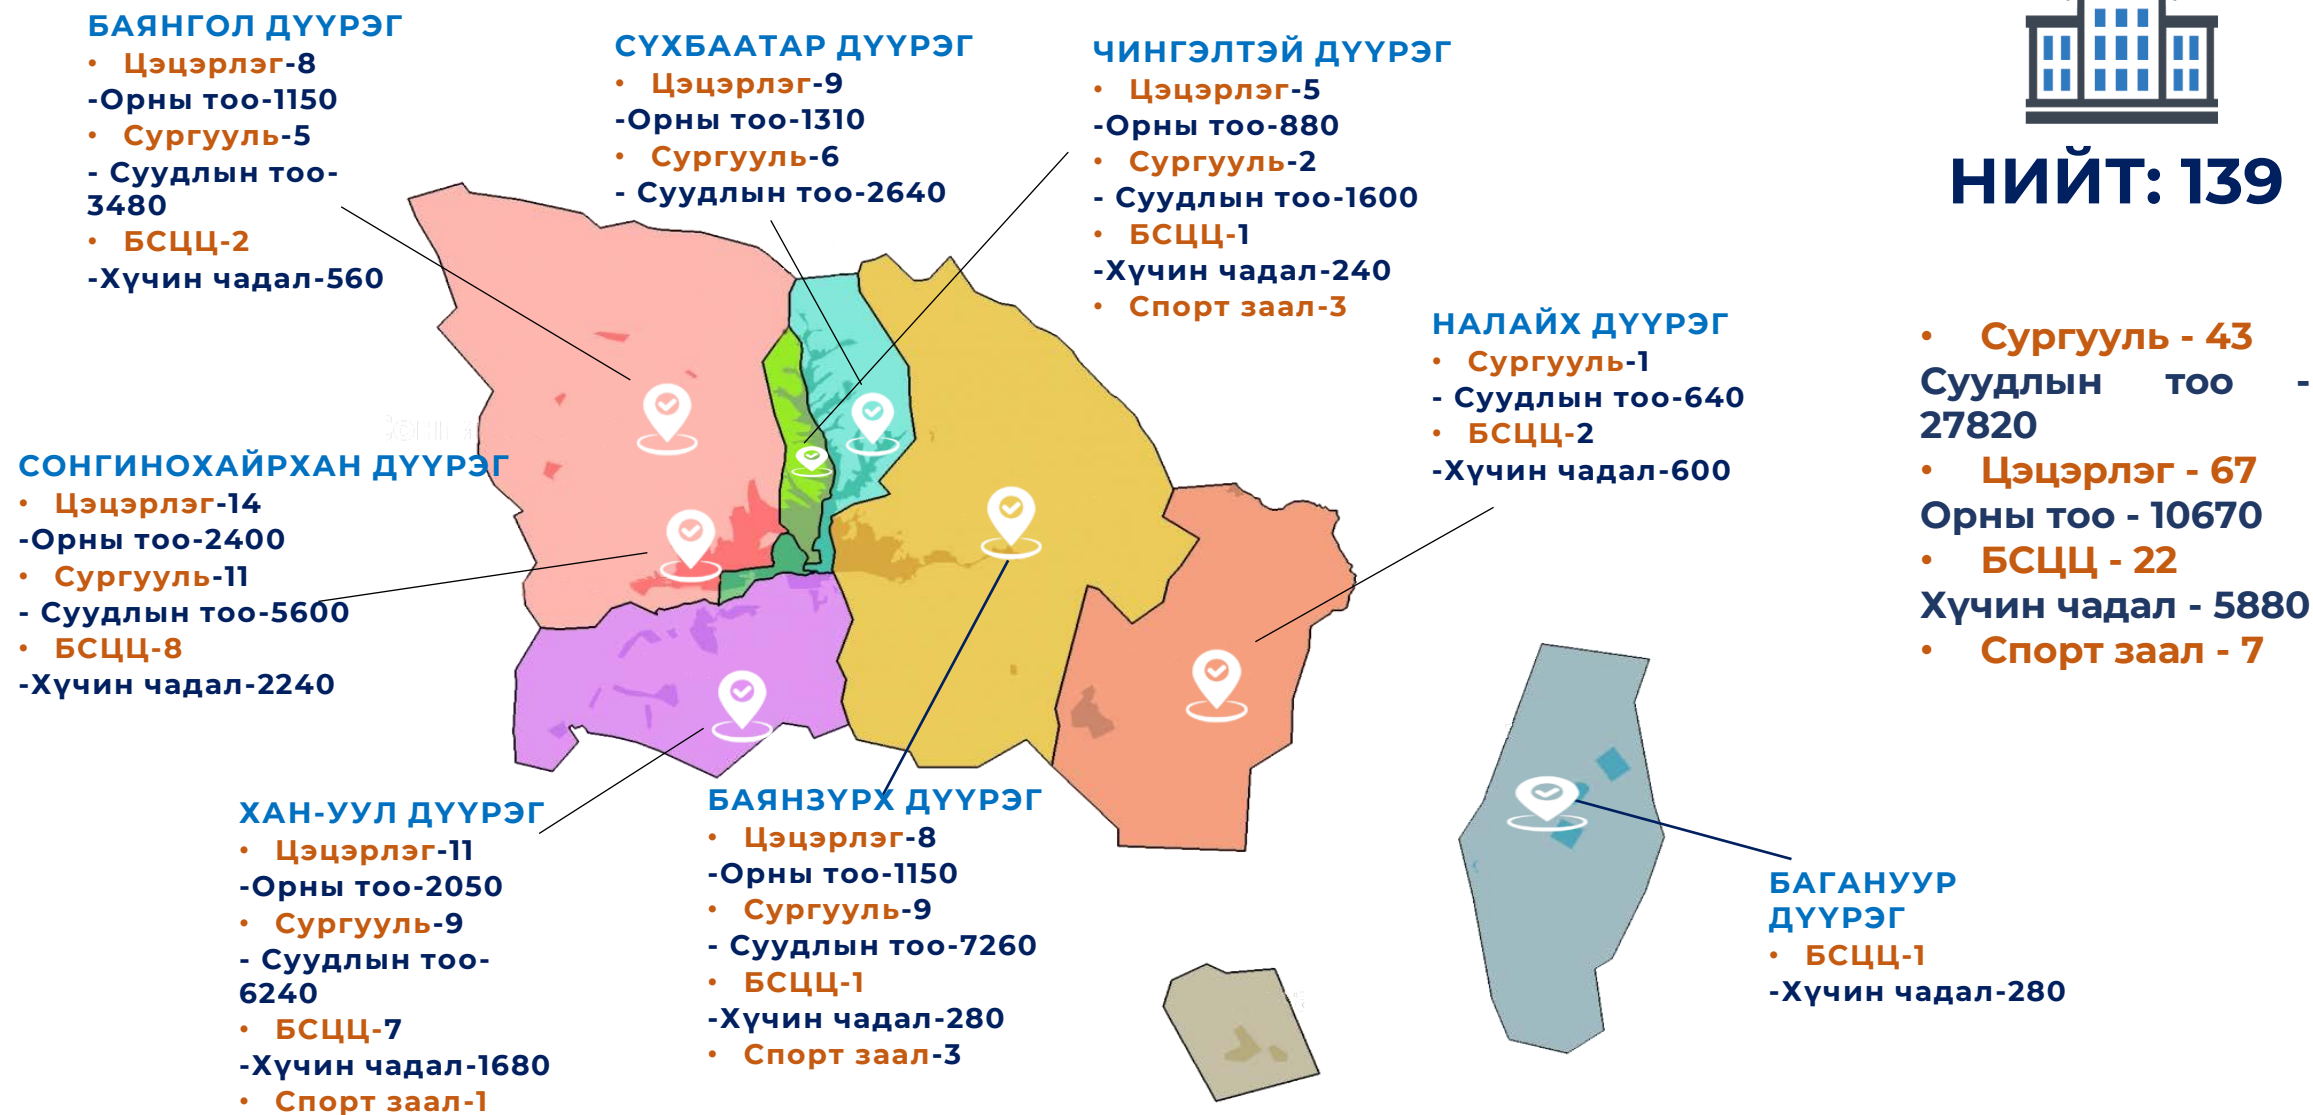





2025 ОНД УЛС, НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН 27.1 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨӨР НИЙТ 177 СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИЛГАД ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА.

(сая төгрөг)

№	Дүүрэг	Батлагдсан төсөв /НТХО/	Батлагдсан төсөв /НОНХС/	Батлагдсан төсөв /Дүүрэг/
1	Баянгол		2,640.0	2,330.7
2	Баянзүрх		4,500.0	4,931.6
3	Сонгинохайрхан		4,500.0	886.4
4	Сүхбаатар		1,760.0	2,938.8
5	Хан-Уул		2,640.0	645.1
6	Чингэлтэй		1,760.0	2,346.0
7	Багануур	3,232.6	880.0	
8	Багахангай		440.0	106.7
9	Налайх		880.0	
	Дүн	3,232.6	20,000.0 <i>(10.0 тэрбум нь эрүүл мэндийн байгууллагын засварт)</i>	14,185.3



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР:

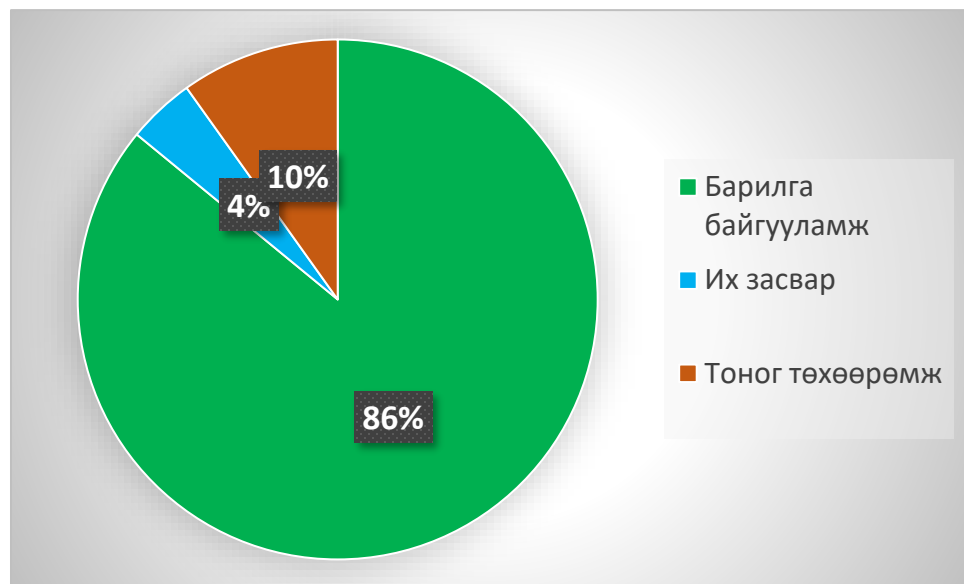

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

285,248.46

/ тэрбум төгрөг /




СЭЛБЭ ОРОН СУУЦЖУУЛАХ ТӨСӨЛ



ТУУЛЫН ХУРДНЫ ЗАМ




“ХҮННҮ” ХОТЫНЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ

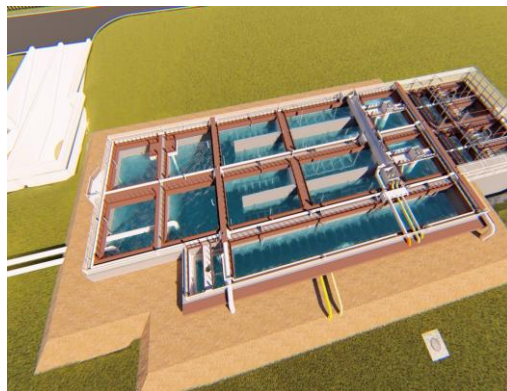


ЭМЭЭЛТ ЭКО АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК



УЛААНБААТАР МЕТРО

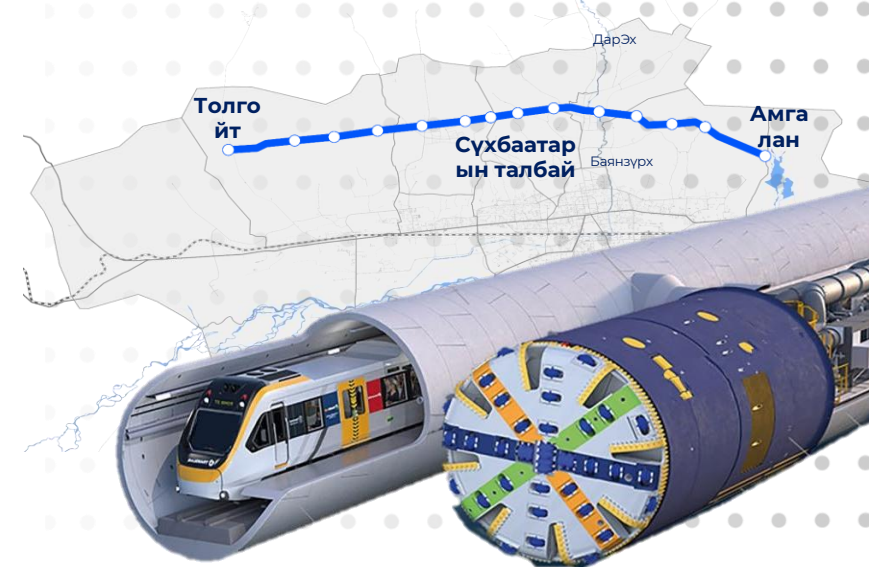



ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ

**НИЙТ 9
ТӨСӨЛ,
ХӨТӨЛБӨР**

**ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН
7 ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР**

**БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН
2 ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР**

**ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИЖ
БАЙГАА ТӨСЛҮҮДИЙН НИЙТ
САНХҮҮЖИЛТИЙН ДҮН**

**ГАДААДЫН
ЗЭЭЛ**

734.78
сая ам.доллар

**БУЦАЛТГҮЙ
ТУСЛАМЖ**

23.1
сая ам.доллар


**НЗДТГ
ТӨСӨВ**

103.35
сая ам.доллар

**НИЙТ
ТӨСӨВ**

877.1
сая ам.доллар

- Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр II, III үе шат;
- Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл;
- Баянголын амын орлогод нийцсэн орон сууц барих төсөл;
- Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх төсөл;
- Улаанбаатар хотын орон сууцны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл;
- Улаанбаатар хотод төмөр зам доогуур авто замын нүхэн гарц барих төсөл;
- Улаанбаатар хотын тогтвортой авто зам, тээвэр төсөл
- Ногоон-Улаанбаатар орон сууц төсөл
- Улаанбаатар хотын зам тээврийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах төсөл



ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ

№	Төсөл, хөтөлбөрүүд	Санхүүжүүлэгч	Хэрэгжих хугацаа	Төсөвт өртөг	Гүйцэтгэлийн хувь
1	Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл - 2	АХБ, ЕХОБ	2017-2026	USD 126.58 сая /хөнгөлөлттэй зээл, Нийслэл төсөв/	
2	Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл - 3	АХБ, ЕХОБ	2020-2026	USD 77.05 сая /хөнгөлөлттэй зээл, Нийслэл төсөв/	
3	Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл	АХБ, УАНС	2018-2027	USD 263.0 сая /хөнгөлөлттэй зээл, Нийслэл төсөв/	45%
4	Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх төсөл	БНФУ	2020-2027	EUR 60.7 сая /хөнгөлөлттэй зээл/	30%
5	Баянголын аманд орлогод нийцсэн орон сууцны хороолол барих төсөл	БНСУ-ын ЭКСИМ банк	2020-2025	USD 114.7 сая /хөнгөлөлттэй зээл/	25%
6	Улаанбаатар хотын тогтвортой авто зам, тээвэр төсөл	ДБ	2021-2026	USD 115 сая /хөнгөлөлттэй зээл, Нийслэл төсөв, буцалтгүй тусламж/	44%
7	Улаанбаатар хотын орон сууцны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл	НАМА Фасилити буцалтгүй тусламж	2023-2032	EUR 18.0 сая /буцалтгүй тусламж/	20%
8	Улаанбаатар хотод төмөр зам доогуур авто замын нүхэн гарц барих төсөл	БНХАУ-ын ЗГ	2022-2026	USD 30.9 сая /хөнгөлөлттэй зээл/	30%
9	Ногоон-Улаанбаатар орон сууц төсөл	ЕСБХБ	2023-2026	USD 25 сая /хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж/	8%
10	Улаанбаатар хотын зам тээврийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах төсөл	БНСУ	2025-2027	USD 1,9 сая /буцалтгүй тусламж/	0%



**АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА**
